

Projektplan: Avfallsplanering för Österåkers kommun

Projektbeställare Kent Gullberg

Författare C. Rydstrand

Datum	2019-03-05
Version	3
Ärendenr.	KS 2018/0351

Innehållsförteckning

1. Bakgrund.....	3
2. Syfte, mål och övergripande tidplan	3
3. Omfattning och resultat	3
4. Tidplan med delmål och aktiviteter	4
5. Organisation och bemanning.....	5
6. Budget	5
7. Projektavslut.....	6

1. Bakgrund

Alla kommuner ska ha en avfallsplan enligt bestämmelser i Miljöbalken. Nu gällande avfallsplan för Österåkers kommun gäller för perioden 2012- 2020. Arbetet bör inledas i början av 2019 genom att utvärdera gällande plan och klargöra gränsdragningar mellan nya styrdokument för avfallsplanering och andra styrdokument. Den kommunala avfallsplaneringen omfattar allt avfall, inte bara det som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Avfallsplaneringen genomförs utgående från nationella mål och övergripande principer så som EU:s avfallshierarki, vilket innebär att frågor om förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning inkluderas. Avfallsplaneringen bör även beakta tillämpliga delar av Agenda 2030 och exempelvis styra mot målet Giftfri miljö.

2. Syfte, mål och övergripande tidplan

Projektets mål är att upprätta ny Avfallsplan åtföljd av reviderad Avfallstaxa samt Avfallsföreskrifter. Styrdokumenterna ska kunna antas senast när innevarande Avfallsplan löper ut 2020. Arbetet kommer också att omfatta underlag för framtagande av Riktlinjer för hållbart byggande med avseende på avfallsfrågor samt kommunikation av avtagna styrdokument.

Syftet med avfallsplanering är att bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle där människa, miljö och natur samverkar, och skapar förutsättningar för en fortsatt bebyggelseutveckling. Genom en god avfallsplanering kan Österåkers kommun bidra till att avfallsrelaterade mål på internationell, nationell, regional och lokal nivå nås.

3. Omfattning och resultat

Inom ramen för avfallsplaneringen upprättas mål och strategier för kommunen som geografiska yta, prioriteringar och konkreta åtgärdsförslag och bestämmelser. Arbetet dokumenteras i form av Plan för förebyggande och hantering av avfall, Avfallstaxa

samt Avfallsföreskrifter. Arbetet kommer också att omfatta underlag för framtagande av Riktlinjer för hållbart byggande med avseende på avfallsfrågor.


För att bedrivas så rationellt som möjligt kommer projektet att i möjligaste mån tillgodogöra sig erfarenheter av det redan pågående arbetet med ny gemensam avfallsplan för Sörabs medlemskommuner. Österåker kommun avser att utgå från samma omvärldsbevakning och övergripande mål (se bilaga 1), eftersom dessa är nyligen framtagna samt ett resultat av samma principer som beskrivs i avsnitt 1 ovan.

4. Tidplan med delmål och aktiviteter

Projektstart	apr 2019
Beslut om arbetsgrupper i styrgrupp	apr 2019
Redovisning utvärdering föregående plan samt strategisk inriktning för styrgrupp	apr 2019
Utredningar, arbetsgruppsaktiviteter och delmål	maj-nov 2019
Remissversion till styrgrupp	dec 2019
Remisstid och konsekvensanalyser	jan-feb 2020
Samrådsversion till KS, beslut om utställning	maj 2020
Utställning till allmänheten, 8 veckor	jun-jul 2020
Slutversion till styrgrupp	sep 2020
Beslut i KF	dec 2020
Kommunikation av planens innehåll	jan-mar 2021
Slutrapport beslutad i styrgrupp	mar 2021

5. Organisation och bemanning

Arbetet med Avfallsplanen avses bedrivas i samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten AB.

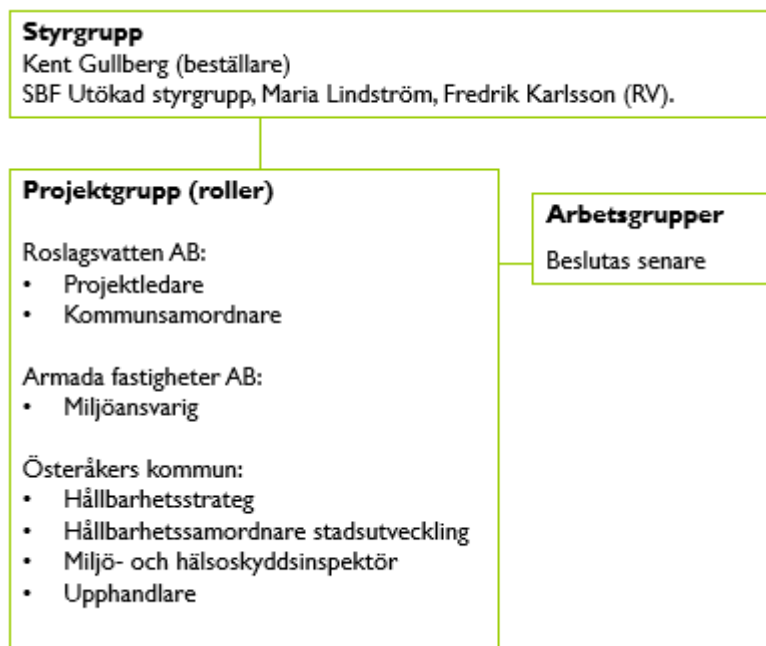

Utöver den fasta organisationen kommer tillfälliga arbetsgrupper beslutas av styrgruppen i ett senare skede. Arbetsgrupperna syfte är att utreda och förankra specifika delfrågor under utredningsfasen av projektet.

6. Budget

Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 1,8 MSEK, varav Roslagsvatten står för 1,0 MSEK och Österåkers kommun för 0,8 MSEK. Kostnadsfördelningen under projektperioden 2019-2021 uppskattas enligt följande:

KSEK	2019	2020	2021
Projektledning	378	297	42
Projektgrupp	378	270	0
Referensgrupp	25	13	0
Konsulter (vägar, MKB mm)	160	300	0
Summa	940	880	42
varav Roslagsvatten	580	450	25
varav Österåkers kommun	360	430	17

Totalt:	1 860
---------	-------

7. Projektavslut

Projektet avslutas när styrdokumenterna för avfallsplaneringen antagits av kommunfullmäktige och kommunicerats i förvaltningar och till allmänhet samt beslut om slutrapport tagits i styrgruppen.
